



TOGO

**Programme d'urgence de renforcement de la résilience
dans la région des savanes**

"Savanes Yalim"





- 1. La région de l’Afrique de l’Ouest est confrontée à une dégradation continue de la situation sécuritaire liée à plusieurs facteurs.**
- 2. Dans ce contexte, le Togo s’est engagé dans une dynamique de transformation économique et d’inclusion sociale avec pour principal impact une baisse du taux de pauvreté et une augmentation constante de la richesse nationale.**
- 3. La feuille de route gouvernementale adoptée en 2020, structurée autour de l’inclusion, de la création de richesses et du renforcement des structure de l’Etat visait à amplifier la dynamique ainsi créée.**
- 4. Suite à la première attaque terroriste intervenue sur le sol togolais, les échanges avec les populations de la région des savanes se sont intensifiés, sous la conduite de Son Excellence Monsieur le Président de la République, afin de préciser et affiner les besoins des populations dans un cadre participatif.**
- 5. Il faut rappeler que cette région à faible densité et enclavée est la plus exposée en raison de son caractère frontalier.**
- 6. Dans l’esprit d’amplifier et intensifier les actions en cours, en particulier dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, un programme d’urgence pour la région des savanes (PURS) a été élaboré. Il vise à fournir le cadre opérationnel pour la mise en œuvre de la vision de notre pays face à la menace terroriste : renforcer la sécurité et réduire les vulnérabilités.**
- 7. Le PURS sera mis en œuvre entre 2022 et 2025 avec une phase d’urgence sur 2022. Son coût, estimé à 258,77 Mds FCFA sur toute la période (2022 – 2025) dont 45,24 Mds pour l’année 2022. Il va prioriser l’accès aux services sociaux de base que sont l’eau, l’électricité, les pistes rurales, la santé, l’éducation, le digital.**
- 8. L’ambition conformément à la vision de SEM le Président de la République est de mener ce programme en très grande cohérence avec les partenaires et dans le respect des principes habituels de redevabilité mais aussi de célérité.**



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Togo, un pays dynamique qui a enregistré des avancées significatives au cours des dernières années

Un pays dans une dynamique positive



3ème (pays réformateur au monde et 1er en Afrique de l'Ouest en 2020*)



5% de croissance moyenne sur les dix dernières années et **2%** en 2020



Près de **22 points de pourcentage de baisse du taux de pauvreté** entre 2006 et 2019

...qui ambitionne d'accélérer la marche vers le progrès économique avec une nouvelle feuille de route gouvernementale (2020-2025)



1 Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociales et garantir la paix



2 Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie



3 Moderniser le pays et renforcer ses structures

La feuille de route, en mettant l'accent sur l'inclusion sociale porte une attention particulière aux vulnérabilités, notamment territoriales.

Ce qui se matérialise par des actions spécifiques au profit de la région des savanes, région particulièrement exposée aux risques sécuritaires compte tenu de son caractère frontalier.



En novembre 2021, la menace sécuritaire s'est manifestée brutalement par une attaque contre notre pays dans la localité de Sanloaga (Préfecture de Kpendjal dans la région des savanes) (1/2)

1

Notre pays avait **anticipé** sur la dégradation de la situation sécuritaire en déployant l'opération « Koundjoaré » dès 2018 dans les localités les plus exposées. Ce déploiement a permis de maintenir une présence sécuritaire adaptée dans ces zones.

2

Cette présence sécuritaire s'est accompagnée de **projets à vocations sociales et économiques au profit des populations**. En effet, la stratégie du Togo est de **coupler la réponse sécuritaire à la réponse aux vulnérabilités sociales**.

3

Après l'attaque de Sanloaga, les **échanges avec les populations** se sont intensifiés sous le leadership du **Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur le Président de la République**. Ces échanges répétés et ciblés ont permis de préciser et quantifier les **besoins** des populations. Ils ont également permis de mesurer leur engagement dans la lutte contre la menace terroriste.

4

Le gouvernement a décidé que des actions spécifiques soient menées pour répondre à ces besoins sur le fondement de quelques **principes directeurs** : **la célérité dans l'exécution, la focalisation sur les besoins sociaux de base prioritaires et le renforcement des liens entre les populations et les forces de défense et de sécurité**.

5


Le Programme d'urgence viendra donc **amplifier les actions en cours, les booster et les réorienter pour plus d'impact sur les populations**. Parallèlement, les actions engagées se poursuivront également.

Un programme d'urgence pour la région des savanes a donc été élaboré avec pour priorité les localités directement frontalières en raison de leur exposition au risque sécuritaire

Nous sommes conscients des défis qui se posent par ailleurs sur les questions de ressources humaines dans les zones reculées. Le secteur de la santé par exemple est déjà en collaboration avec la Banque mondiale et les réflexions se poursuivent également entre l'éducation et de la fonction publique en vue de créer un cadre permettant d'accompagner et de motiver des agents qui seront affectés dans ces zones.



En novembre 2021, la menace sécuritaire s'est manifestée brutalement par une attaque contre notre pays dans la localité de Sanloaga (Préfecture de Kpendjal dans la région des savanes) (2/2)

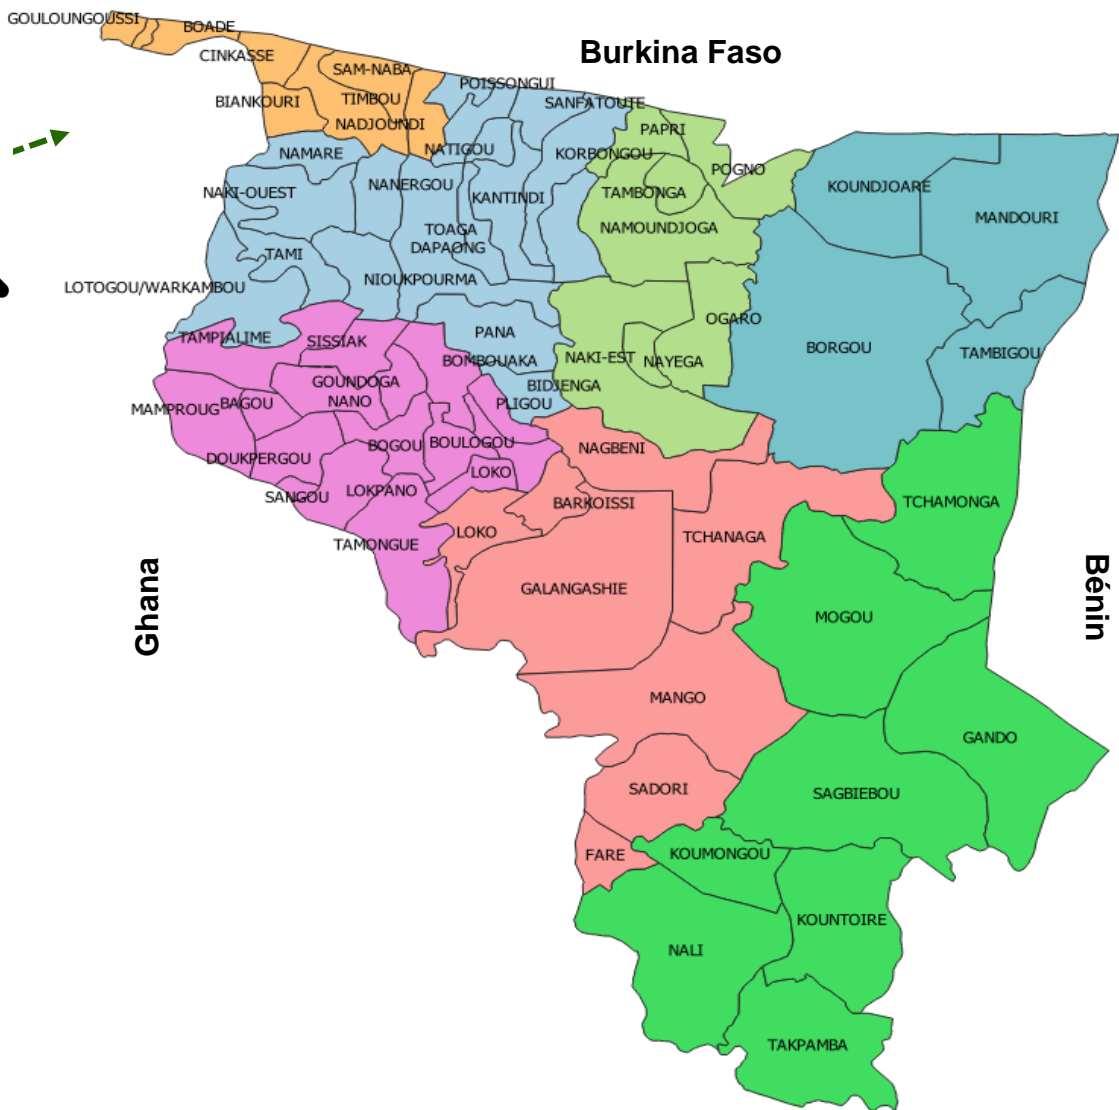

Région des Savanes

- Superficie : **8 470 km²**
- Population : 1 054 700 habitants en 2022
- Densité : **125 habitants au km² (très faible)**
- Structure par sexe : 51,7% de femmes / 48,3% d'hommes
- **07** préfectures (Tône, Cinkassé, Tandjouaré, Kpendjal, Kpendjal Ouest, Oti et Oti sud) composées de **16** communes, **69** cantons et **1 073** villages
- Structure par âge : 45,7% (< 15 ans) ; 13,9% (< 45 ans) et 15 40,5%44 ;
- Conditions naturelles : **longue saison sèche et petite saison pluvieuse**



Le gouvernement mettra en œuvre un programme d'urgence pour la région des savanes afin d'accélérer l'accès des populations aux services sociaux de base prioritaires



Renforcer la résilience des populations...

L'objectif général du programme est de renforcer la résilience des populations face à la menace djihadiste grandissante et aux effets néfastes de la crise sanitaire de la covid-19, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie.

Spécifiquement, il s'agit de :

- assurer un meilleur accès des populations aux services sociaux de base ;
- renforcer les capacités productives de la région ;
- rapprocher davantage l'administration des populations ;
- améliorer la mobilité et les conditions de ravitaillement des forces de défense et de sécurité déployées dans le cadre de l'Opération Koundjoaré ;
- renforcer la sécurité dans la région des savanes.



...en se focalisant sur les services sociaux de base prioritaires

3 composantes interconnectées



Composante 1 :
amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base




201,38



Composante 2 :
renforcement des capacités des communautés à générer de la richesse



30,98



Composante 3 :
renforcement de la sécurisation et de l'administration du territoire



26,42


Coût total estimatif du programme :
258,77 Mds FCFA* dont 45,24 Mds FCFA* pour la première phase (2022).

* : Hors sécurité, défense




Coût du programme d'urgence sur la période 2022-2025

Répartition du budget global par secteur d'intervention

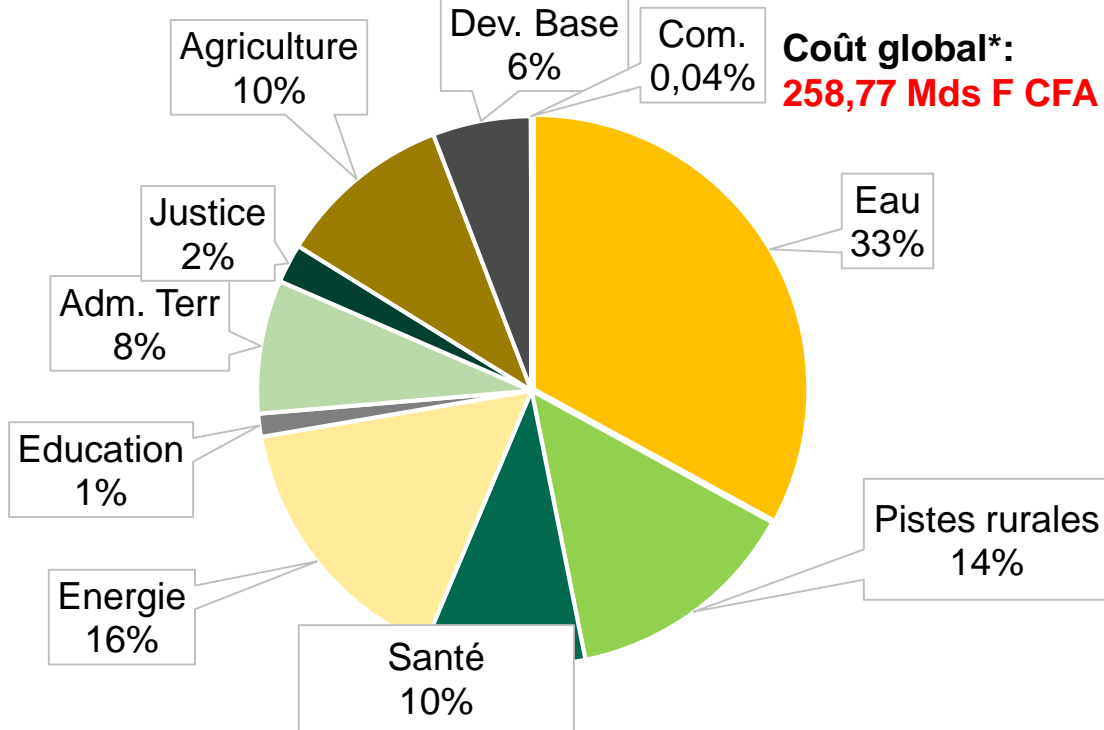

- La plus grande part du budget global revient au secteur de l'eau avec des travaux qui s'élèvent à **85,3 Mds F CFA**. Il est suivi par le secteur de l'électricité dont le budget s'élève à **41,3 Mds F CFA**.

Disponibilité et gap de financement global (Milliards F CFA)

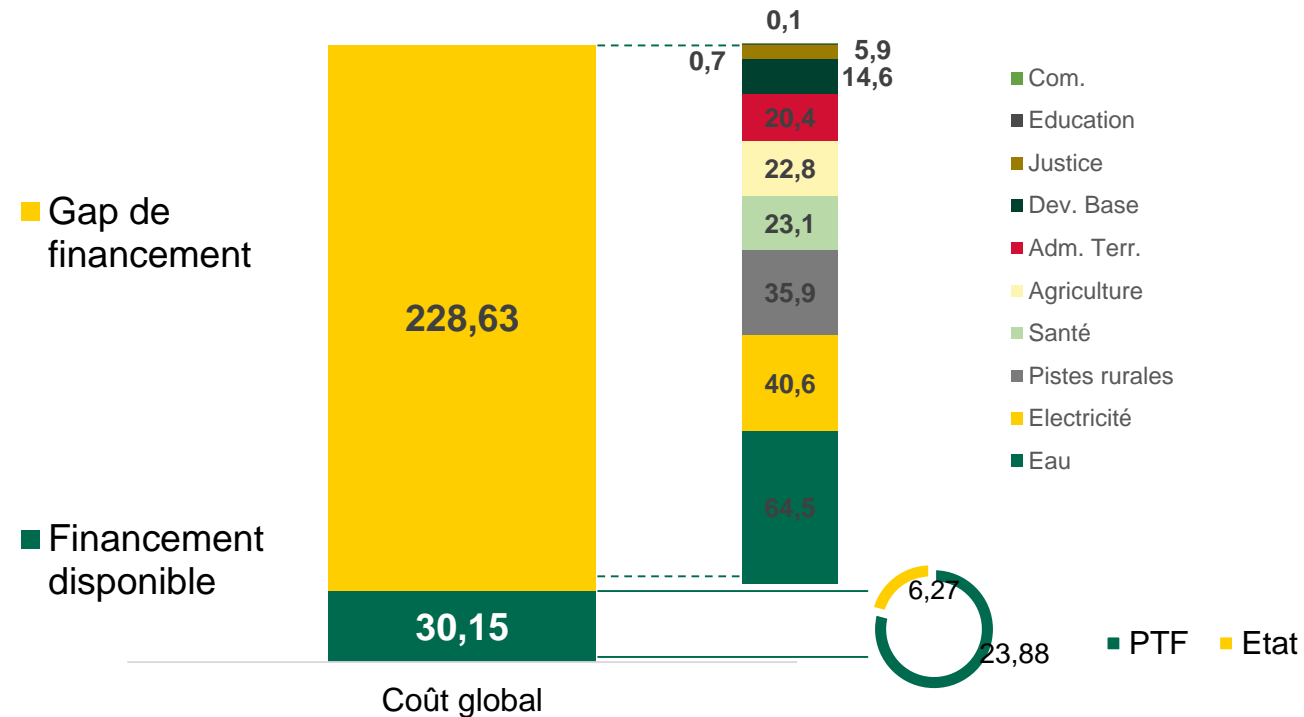

- Le gap de financement à rechercher est de **228,63 Mds F CFA**. Les secteurs concernés sont : l'eau (64,5 Mds), l'électricité (40,6 Mds), les pistes rurales (35,9 Mds), la santé (23,1 Mds), l'agriculture (22,8 Mds), l'administration territoriale (20,4 Mds), le développement à la base (14,6 Mds), la justice (5,9 Mds), l'éducation (0,7 Mds), la communication (0,1 Mds).
- Le financement disponible est de **30,15 Mds F CFA** dont : Etat 6,19 Mds, PTF 23,88 Mds, autres 0,08 Mds.


* : Hors sécurité et défense.

• Pour le secteur du numérique, les coûts seront supportés par les opérateurs économiques




Coût du programme d'urgence sur la période 2023-2025

Répartition du budget global par secteur d'intervention

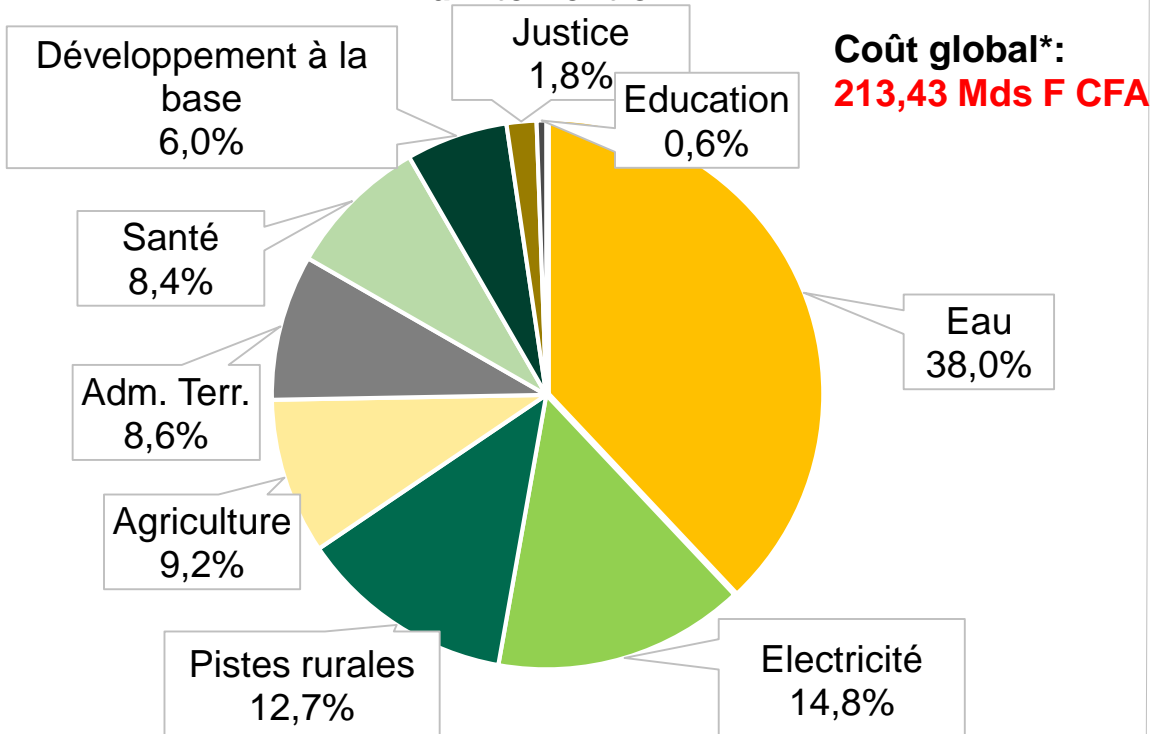

• La plus grande part du budget global revient au secteur de l'eau avec des travaux qui s'élèvent à **81,06 Mds F CFA**. Il est suivi par le secteur de l'électricité dont le budget s'élève à **31,62 Mds F CFA**.

Disponibilité et gap de financement global (Milliards F CFA)

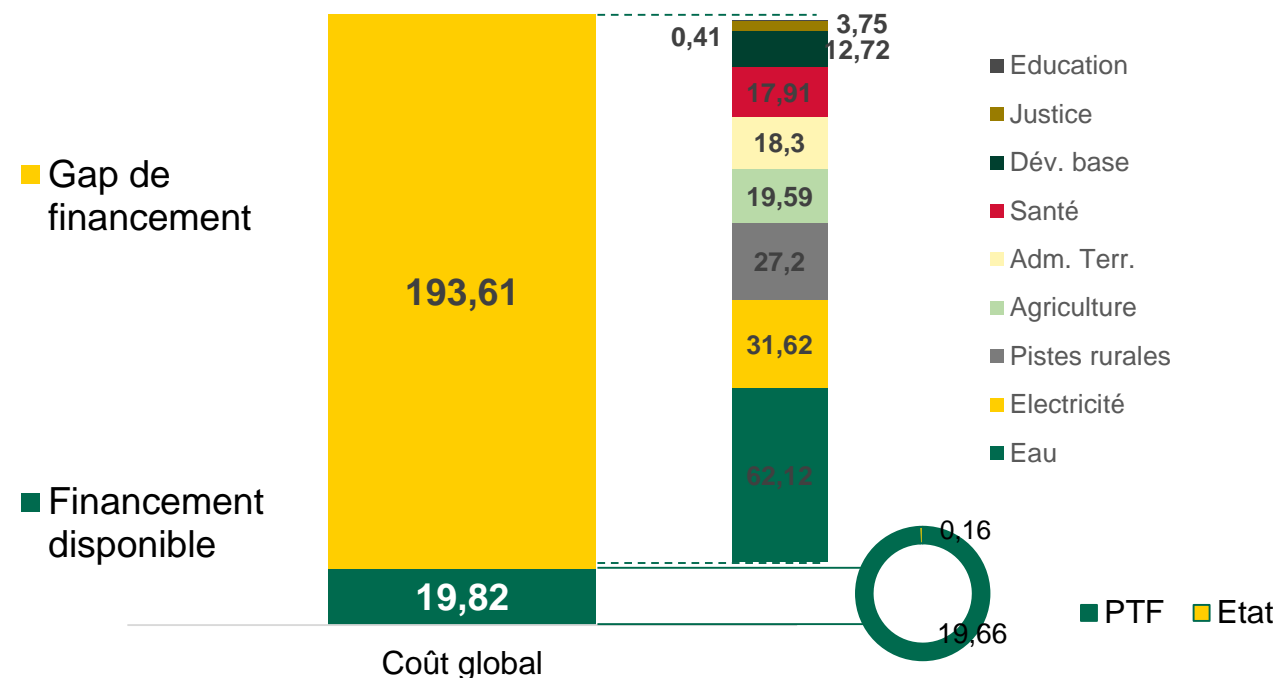

• Le gap de financement à rechercher est de **193,61 Mds F CFA**. Les secteurs concernés sont : l'eau (62,12 Mds), l'électricité (31,62 Mds), les pistes rurales (27,20 Mds), l'agriculture (19,59 Mds), l'administration territoriale (18,3 Mds), la santé (17,91 Mds), le développement à la base (12,72 Mds), la justice (3,75 Mds), l'éducation (0,41 Mds)

• Le financement disponible est de **19,82 Mds F CFA** dont : Etat 0,16 Mds, PTF 19,66 Mds.

* : Hors sécurité et défense.


• Pour le secteur du numérique, les coûts seront supportés par les opérateurs économiques



Coût du programme d'urgence pour l'année 2022


Répartition du budget 2022 par secteur d'intervention

Coût 2022*:
45,24 Mds F CFA

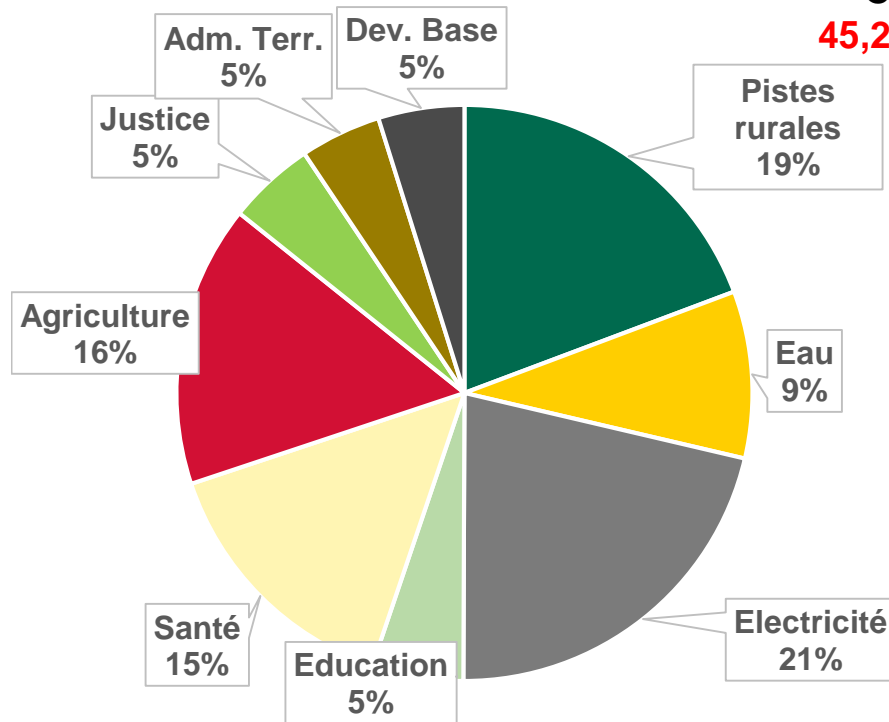

- La plus grande part du budget revient au secteur de l'énergie avec des activités qui s'élèvent à **9,68 Mds F CFA** pour la première année (2022) pour la phase d'urgence. Il est suivi par le secteur du désenclavement et des pistes rurales dont le budget s'élève à **8,72 Mds F CFA**.

Disponibilité et gap de financement phase 2022 (Milliards F CFA)

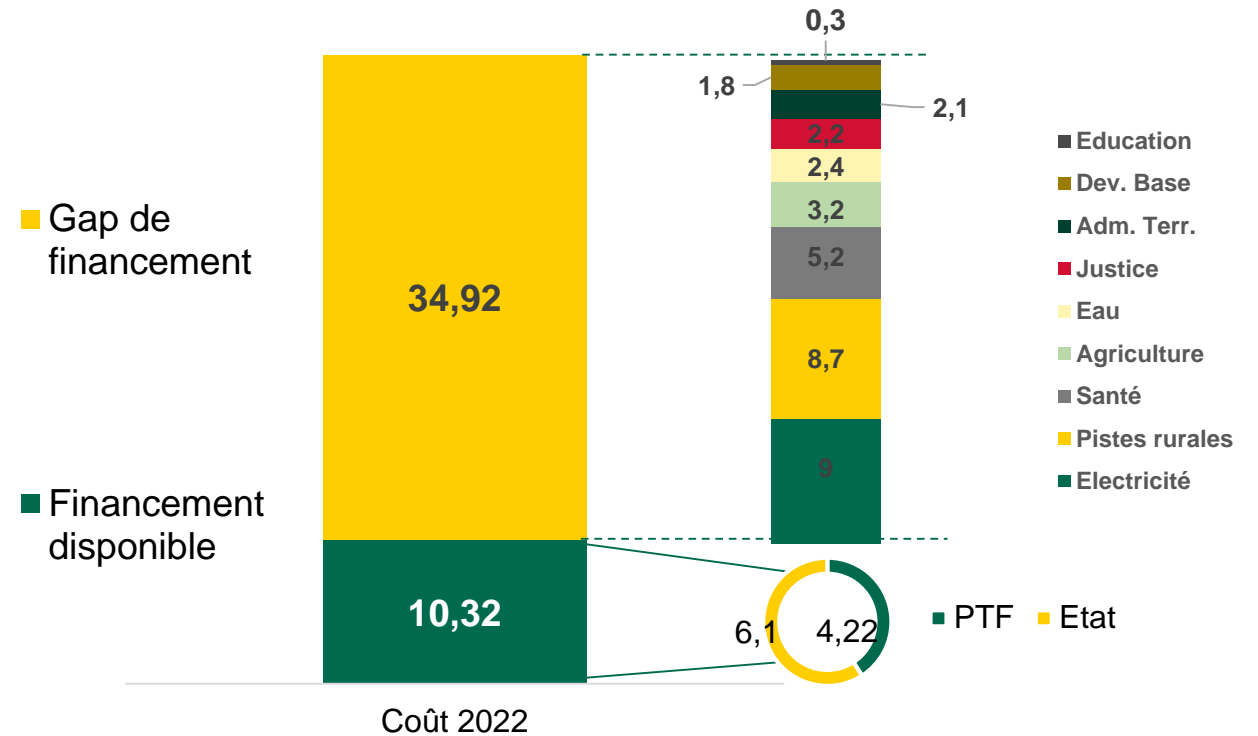

- Le GAP de financement à rechercher est de **34,92 Mds FCFA**. Les secteurs concernés sont : **l'électricité** (9 Mds), **les pistes rurales** (8,7 Mds), **la santé** (5,2 Mds), **l'agriculture** (3,2 Mds), **la justice** (2,2 Mds), **le développement à la base** (1,8 Mds), **l'eau** (2,4 Mds), **l'éducation** (0,3 Mds), **l'administration territoriale** (2,05 Mds).
- Le financement disponible est de **10,32 Mds F CFA** dont : Etat 6,10 Mds et PTF 4,22 Mds

* : Hors sécurité et défense.

• Pour le secteur du numérique, les coûts seront supportés par les opérateurs économiques



Présentation détaillée des composantes du programme

1

Composante 1

Amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base

2

Composante 2

Renforcement des capacités des communautés à générer de la richesse

3

Composante 3






Renforcement de la sécurisation et de l'administration du territoire



Composante 1 : Amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base

Coût : 201 378 844 392 FCFA*

Les populations notamment les plus vulnérables ont un accès équitable aux services sociaux de base de qualité

Indicateurs de performance	Valeur actuelle	Valeur cible	Actions à réaliser	Coûts (Mds FCFA)
 Taux d'accès à l'eau potable dans la région des savanes en milieu rural	64%	100%	Construction de postes d'eau autonome, forages, de mini adduction d'eau potable, de retenues d'eau	85,31
 Taux d'accès à l'électricité dans les savanes	22%	90%	Electrification et/ou Extension de l'électrification des localités	41,30
 Nombre de salles de classe construites (avec accès à l'eau et à l'électricité)		+286	Construction de nouvelles salles de classe et renforcement des cantines scolaires	3,53
 Pourcentage du réseau de pistes rurales en bon et moyen état	15%	43%	Ouverture et réhabilitation des pistes rurales	35,92
 Population à moins de 5 km (ou 45 min) d'un centre de soins	47%	70%	Construction et/ou réhabilitation et équipement des CMS, des USP	24,56
			Amélioration de l'accès aux filets sociaux et services de base	10,76

*: Pour le secteur du numérique, les coûts seront supportés par les opérateurs



Désenclavement et pistes rurales – Fiche projet



Objectifs

- Améliorer l'accès des populations exposées à la menace djihadiste aux infrastructures et équipements socio-économiques de base et aux marchés
- Améliorer la mobilité et le ravitaillement des troupes militaires déployées dans la région




Indicateurs **1230** km de routes rurales supplémentaires dans les savanes




Activités principales

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

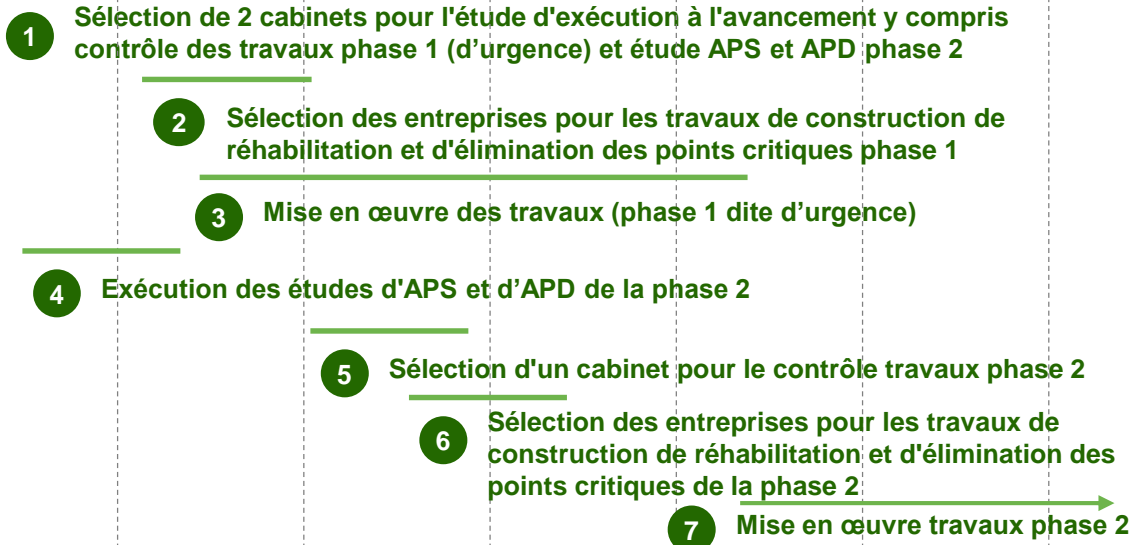

Coûts, Mds de FCFA

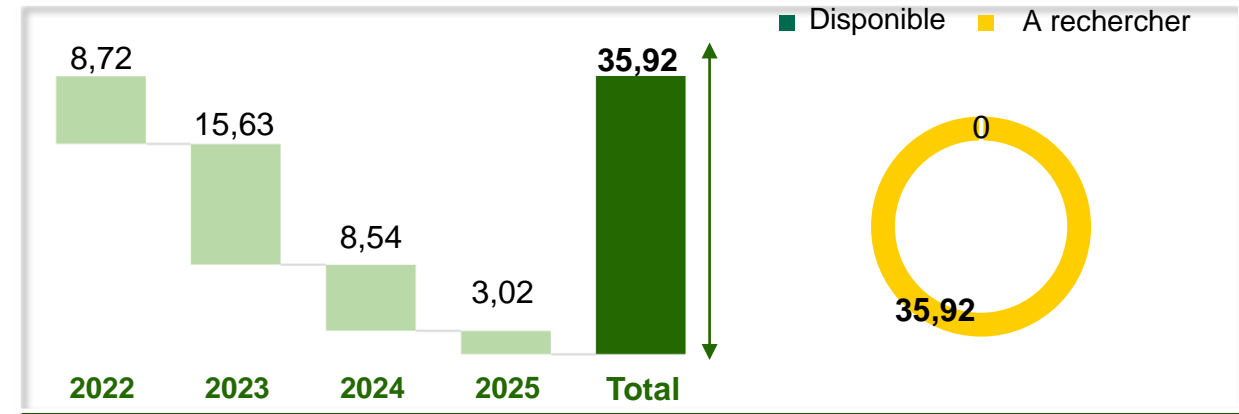

Cibles – Secteur des pistes rurales

- Phase 1** 500 km de pistes rurales
5 ponts majeurs
- Phase 2** 730 km de pistes rurales
5 ponts majeurs



Eau – Fiche projet

Objectifs

- 100% de la population concernée a accès à l'eau potable en milieu rural en 2023

160 k Personnes supplémentaires habitants la région des savanes ont accès aux services d'eau potable

640 Postes d'eau autonomes équipés de kits solaires

6 Villes de la région bénéficient de l'extension des systèmes d'AEP

Activités principales

Mars 2022 Déc 2022 2023 2024 2025 2026

- 1 Réalisation de 640 PEA équipés de kits solaires
- 2 Extension d'adduction d'eau potable dans les villes des Savanes
- 3 Réalisation de 166 retenues collinaires agro-pastorales y compris aménagements dans la région des Savanes

Phase d'urgence

Court et moyen terme

Cibles – Secteur Eau

289 PEA réalisés dans plusieurs localités dans les cantons entre autres de Boadé, Mandouri, Pogno, Mango, Nali, Bagou, Nanergou

26 retenues d'eau collinaires : études réalisés y compris aménagements agro-pastorales


351 PEA réalisés dans plusieurs localités dans les cantons entre autres de Borgou, Naki Est, Barkoissi, Mogou, Nandoga, Dapaong

166 retenues d'eau collinaires agro-pastorales dans 69 cantons y compris aménagements

✓ 1ers résultats

- 52 forages réalisés par la brigade mobile du ministère de l'eau

Coûts, Mds de FCFA

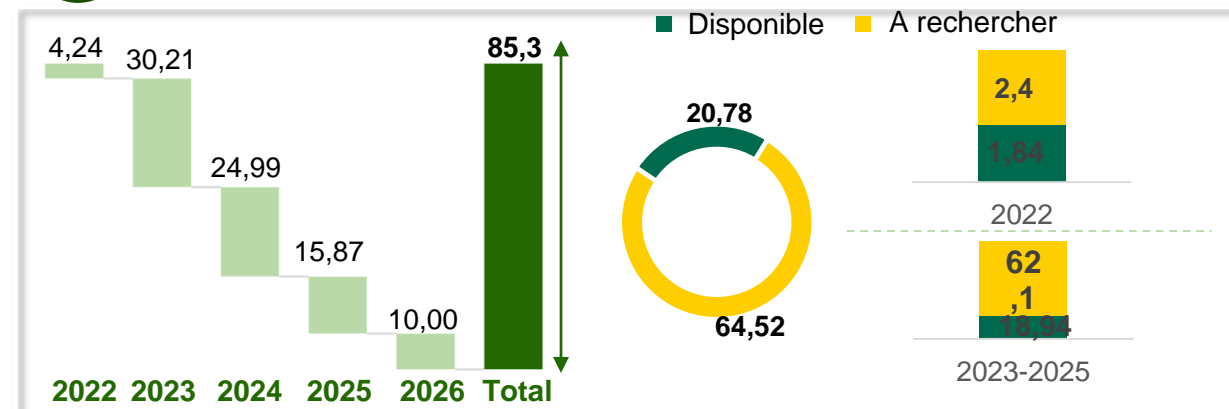



Energie – Fiche projet

Objectifs

- Etendre la couverture électrique à plusieurs localités dans la région des savanes.

Indicateurs

75 544 Ménages raccordés au réseau électrique de distribution national

23 042 Ménages subventionnés pour l'acquisition des kits solaires


Activités principales

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- 1 Réalisation des études de faisabilité technico-économiques et d'impacts environnemental et social
- 2 Réalisation des travaux d'extension de réseau et mini réseaux dans 342 localités (1000 km MT, 700 km BT, 9000 points d'éclairage)
- 3 Installation de 30 groupe-électro-solaires pour les unités des forces de sécurité
- 4 Renforcement de l'alimentation en énergie électrique et stabilité du réseau avec l'acquisition de 4 groupes électrogènes de puissance 4 MW et construction de postes pour diminuer les coupures
- 5 Appui à l'accès des populations à l'électricité avec Subventions aux populations pour prendre en charge les coûts de branchement et d'acquisition des kits
- 6 Sélection d'un cabinet pour le contrôle et la surveillance



Coûts, Mds de FCFA

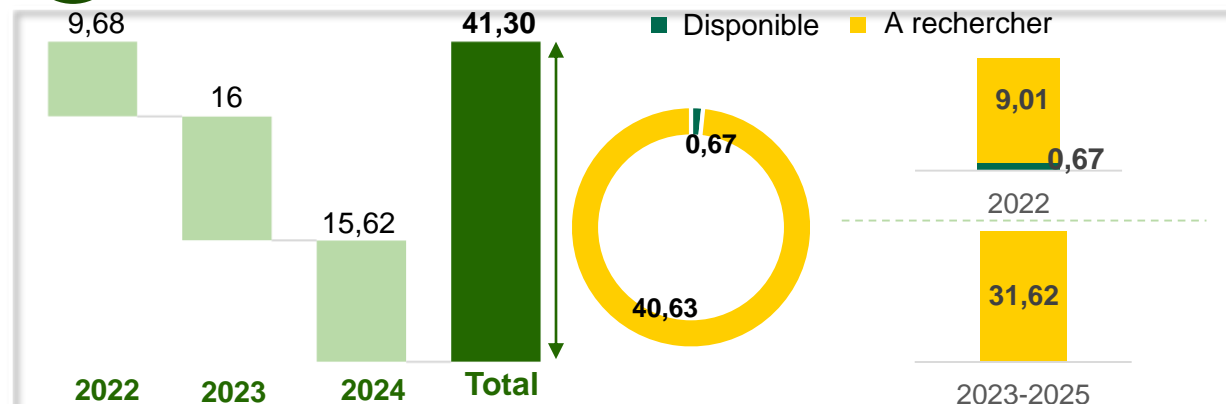

Cibles – Secteur de l'Energie

- | Phase | Localités électrifiées | Ménages électrifiés par extension de réseau | Kits solaires installés | Luminaires installés pour l'éclairage public | km de réseau MT et km BT construite |
|----------------------|------------------------|---|-------------------------|--|---|
| Phase d'urgence | 80 | 17 671 | 7 680 | 2 106 | 236 km de réseau MT et 162 km BT construite |
| Court et moyen terme | 262 | 57 873 | 15 362 | 6 949 | 772 km de réseau MT 531 km BT construite |

✓ 1ers résultats

- 200 lampadaires solaires ont été déployés dans 6 localités : Sanloaga, Tabi, Gouloungoussi, Boadé, Nassiegou, Samnaba



Santé – Fiche projet



Objectifs

L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations de la région des Savanes aux services de santé de base et accroître leur résilience.




Indicateurs 70% Taux d'accessibilité géographique à une formation sanitaire en 2025



Activités principales du projet d'urgence



Coûts, Mds de FCFA

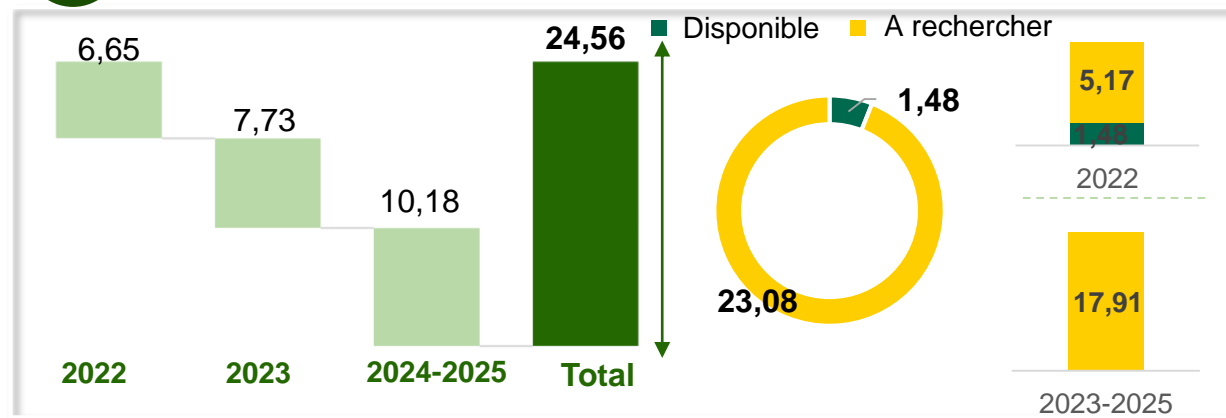

Cibles – Secteur de la santé

- 65 infrastructures sanitaires (construites, réhabilitées, renforcées et transformées) équipées
- 40 USP construites
- 65 infrastructures sanitaires (construites, réhabilitées, renforcées et transformées) approvisionnées en eau et énergie
- 15 USP construites, réhabilitées
- 09 USP transformés en CMS
- 01 CHP achevé
- 453 nombre de personnel de santé additionnels mobilisés/recrutés



Education – Fiche projet



Objectifs

- Renforcer l'accès équitable et inclusif à l'enseignement dans la région des savanes.
- Promouvoir la participation communautaire dans la gouvernance des établissements scolaires à travers l'implication des communautés dans l'implantation et la gestion des infrastructures et équipements scolaires



Indicateurs

- 90%** Taux net d'accès dans la région des savanes
- 92%** Taux net de scolarisation au primaire
- 80%** Taux brut de scolarisation au collège
- 85%** Taux de participation communautaire dans la gestion des établissements scolaire de la région des savanes




Activités principales du projet d'urgence

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- 1** Mission de confirmation des besoins et de collecte des données pour l'élaboration des EIES et des PGES
- 2** Formation des communautés sur l'Organisation de la Dynamique Communautaire et sur la passation des marchés communautaires et transparence
- 3** Lancement et exécution des travaux de construction et équipement de salles de classe primaire (PAQEEB), secondaire 1 (PAREC2, PAQEEB)
- 4** Formation des communautés sur le l'Entretien et la Maintenance des Ouvrages (EMO)
- 5** Construction et équipement de salles de classe au primaire, secondaire (PAAQET)
- 6** Construction et équipement de bloc administratif au secondaire



Coûts, Mds de FCFA

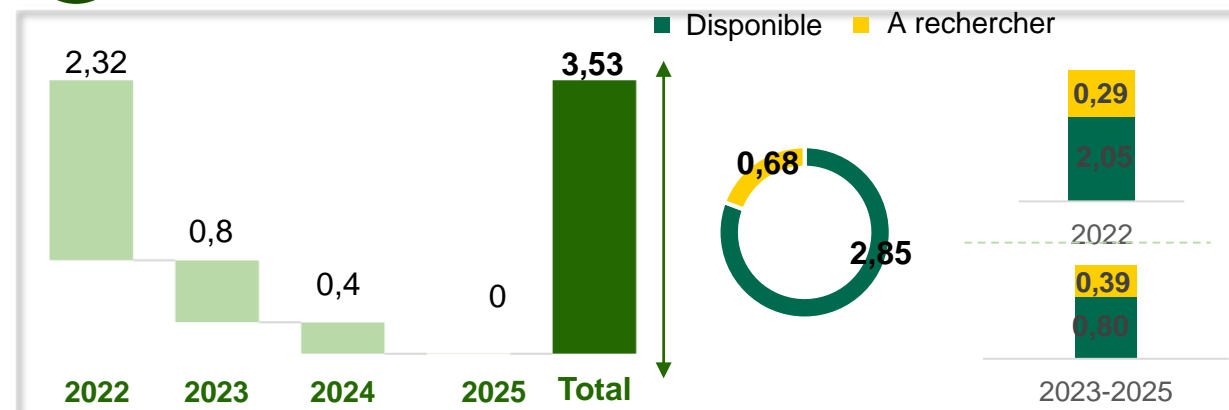

Cibles – Secteur de l'éducation

- 237** Nombre de salles de classes « primaire » construite
- 40** Nombre de salles de classes « secondaires 1 » construite
- 9** Nombre de salles de classes « secondaires 2 » construite
- 14** Nombre de blocs de salles de classes réhabilitées
- 1** Nombre de blocs administratifs construits



Développement à la base – Fiche projet

Objectif

Amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base

Indicateurs


48 122 Elèves bénéficiaires d'un repas chaud

7 Centres de jeunes construits et équipés

Activités principales



Coûts, Mds de FCFA

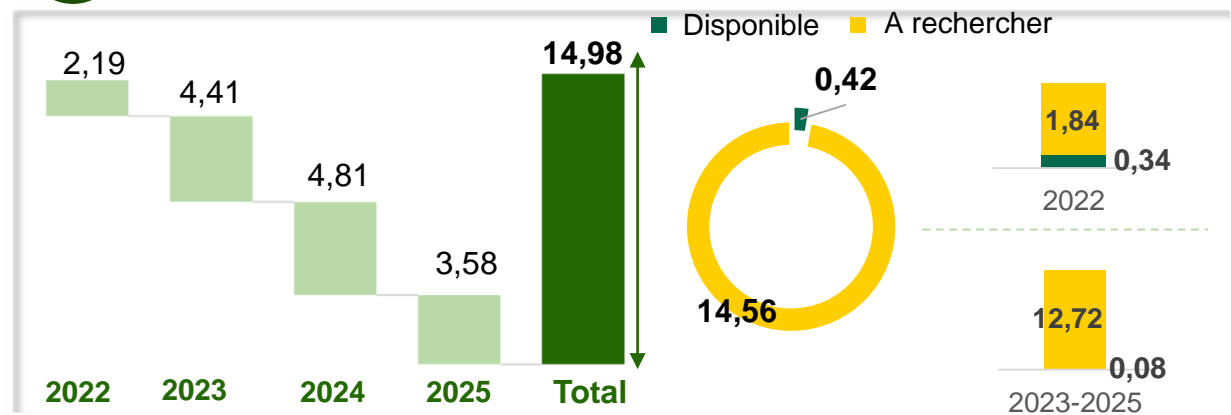

Cibles – Secteur développement à la base

53 écoles bénéficiaires des cantines scolaires
 48122 élèves bénéficiaires d'un repas chaud
 7 centres de jeunes construits



Télécommunication – Fiche projet



Objectifs

- Etendre la couverture de services de communications électroniques à plusieurs localités blanches en privilégiant celles se trouvant dans les zones frontalières ou abritant des points de présence des force de sécurité et de défense nationale



Indicateurs

- 26** Localités dont tous les chefs lieux de préfecture de la région des Savanes, renforcées en service de qualité
- 9** Localités ne disposant d'aucune couverture de services de Télécommunications, desservies
- 9** Points de présence des FAT et des agglomérations environnantes en services de base, couverts



Activités principales du projet d'urgence

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- 1** Desserte en services voix et Data dans 9 localités ne disposant d'aucune couverture de services de Télécommunications
- 2** Renforcement de la qualité de service dans 26 localités dont tous les chefs lieux de préfecture de la région des Savanes
- 3** Couverture effective de 9 points de présence des FAT et des agglomérations environnantes en services de base (voix et Data 3G au moins)
- 4** Implantation de points d'accès communautaires (Wifi Zone) , à tarif subventionné pour 12 mois, dans une zone d'activité commerciale dans chacun des chefs-lieux de préfecture



Coûts, Mds de FCFA

Les coûts des activités seront portés par les opérateurs



Présentation détaillée des composantes du programme

1

Composante 1

Amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base

2

Composante 2

Renforcement des capacités des communautés à générer de la richesse

3

Composante 3

Renforcement de la sécurisation et de l'administration du territoire



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Composante 2 : Renforcement des capacités des communautés à générer de la richesse

Coût : 30 977 001 584 FCFA

Les conditions économiques et les revenus des ménages sont améliorés

50 ZAAP aménagées

2 367 jeunes financés, 237 groupements de jeunes (3596 membres) et 3 PME de jeunes financés (PAEIJ SP + FAIEJ)



100% des communes / cantons disposant d'un plan de développement grâce au Fond d'aide aux collectivités territoriales

3508 emplois créés soit 106% par rapport à la cible prévu (janvier 2022)



Actions à réaliser



Appui à la production agricole



Facilitation de l'accès aux mécanismes de financement appropriés



Organisation des sensibilisations des acteurs de l'écosystème sur les thématiques entrepreneuriales



Accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la création et le développement d'entreprises



Appui en équipement des CDB



Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des bénéficiaires



Création des emplois temporaires



Agriculture – Fiche projet

Objectifs

- Améliorer la production et de la productivité des exploitations agricoles ciblées sur le riz, le maïs, les cultures maraîchères, le soja et les élevages à cycle court
- Améliorer la valorisation et la mise en marché des productions agricoles ciblées



8 000	Hectares de ZAAP aménagées
10 000	Superficie de bas-fonds aménagées
4 000	Kits d'irrigation acquis aux profits des producteurs
50 000	Bénéficiaires touchés par le projet




Activités principales

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- 1** Etudes techniques et études d'impact environnemental et social
- 2** Elaboration des dossiers d'appels d'offres pour le recrutement des prestataires
- 3** Signature de contrat avec les prestataires
- 3** Travaux de réalisation des infrastructures
- 4** Appui à l'accès aux équipements
- 5** Gestion et suivi du projet



Coûts, Mds de FCFA

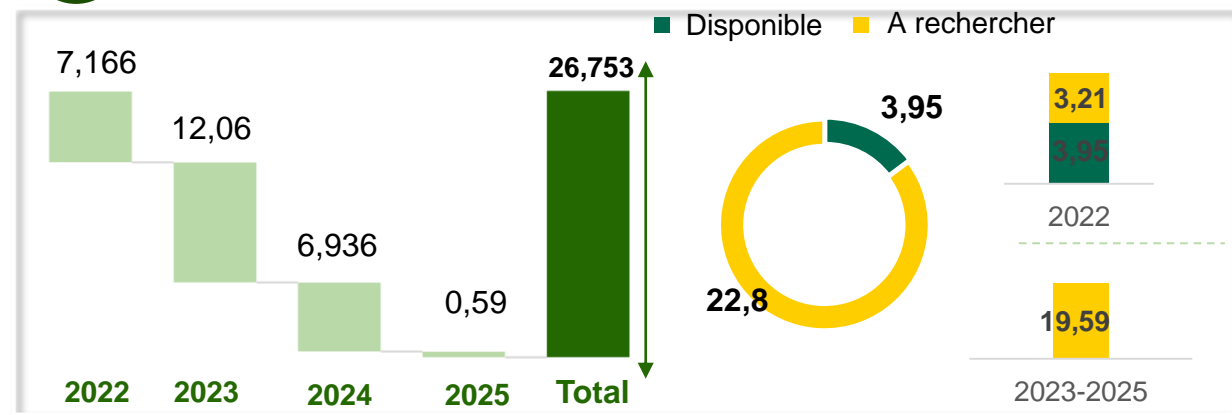

Cibles – Secteur de l'agriculture

- 4 000** kits d'outils de maraichage fournis aux producteurs maraichers
- 3 000** éleveurs dont les capacités en technique d'élevage sont renforcés
- 500 T** semences de riz, de maïs, de soja mise à la disposition des producteurs
- 1,5 T** de semences maraîchères mises à disposition des producteurs
- 3 000 T** fertilisants acquis et mis à disposition des producteurs
- 5 000 L** de biofertilisants acquis et mis à disposition des maraichers
- 30 000** reproducteurs de souches locales mis à la disposition des ménages
- 10 000** Ha de superficie de bas-fonds aménagés
- 100** tracteurs mis à la disposition des producteurs demandeurs
- 50** magasins de stockage construits et équipés
- 140** projets portés par les jeunes financés
- 500** équipements de transformation des produits fournis aux producteurs
- 2** unités de transformation des produits maraichers installés
- 3** aires d'abattages modernes construits



Développement à la base – Fiche projet


Objectif

Renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes


Indicateurs

602 075 Bénéficiaires directs et indirects
32 Marchés y compris les blocs latrines construits
150 Plateformes installées

Activités principales

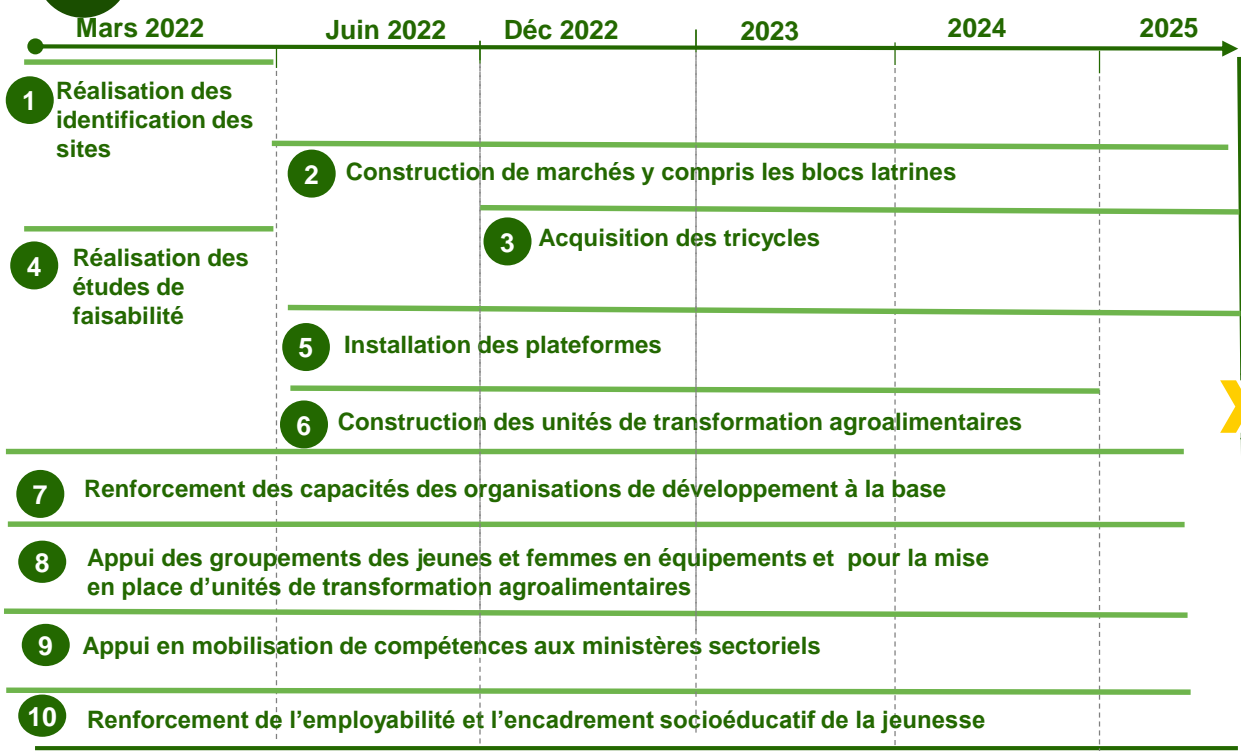

Coûts, Mds de FCFA

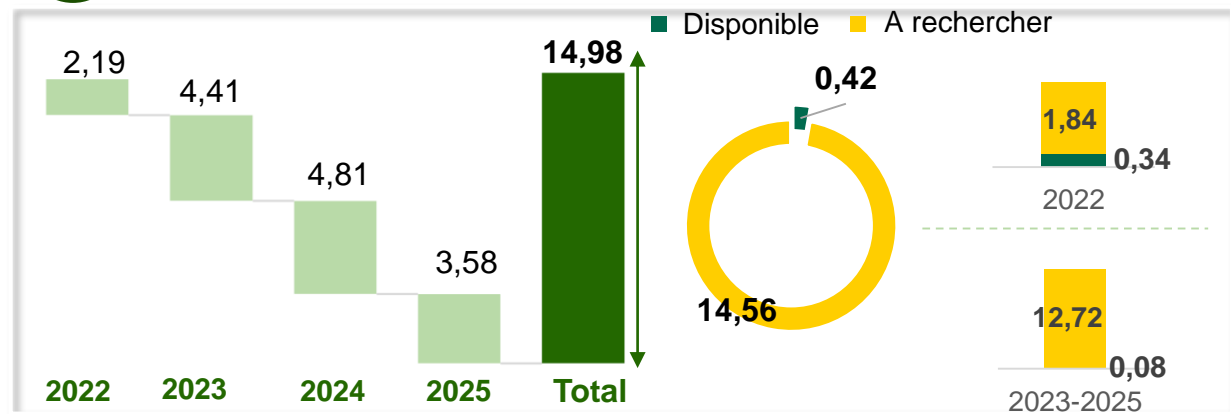

Cibles – Secteur développement à la base

- 32 marchés y compris les blocs latrines construits
- 214 tricycles mis à disposition autour des marchés et des plateformes multifonctionnelle
- 150 plateformes installées
- 3 unités de transformation agroalimentaires installées
- 3136 CDB ayant bénéficiés de renforcements de capacités organisationnelles et techniques
- 640 CDB restructurés
- 1800 jeunes structurés en coopératives
- 500 coopératives renforcés et financés
- 201 coopératives créés autour des unités de transformation
- 3200 jeunes formés sur la citoyenneté et l'engagement civique
- 1760 jeunes équipés en kits d'outillage
- 24 journées d'informations organisés
- 3000 volontaires mobilisés



Présentation détaillée des composantes du programme

1

Composante 1

Amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base

2

Composante 2

Renforcement des capacités des communautés à générer de la richesse

3

Composante 3

Renforcement de la sécurisation et de l'administration du territoire



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Composante 3 : Renforcement de la sécurisation et de l'administration du territoire

Coût : 26 416 816 647 FCFA*

La sécurité et la présence de l'Etat sont renforcées dans la région

Adoption de la loi de programmation militaire

3 128 acteurs locaux formés et sensibilisés

4 nouvelles maisons de justice construites et renforcées

2 nouveaux établissements pénitentiaires réhabilités et renforcés

250 acteurs judiciaires sensibilisés et formés

4 nouveaux locaux déconcentrés de délivrance des duplicata de nationalité togolaise installés

830 jeunes sensibilisés

649 organisations de développement à la base formés



Actions à réaliser



Renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité



Renforcement des capacités des acteurs locaux



Renforcement et extension des maisons de justice



Renforcement de l'administration pénitentiaire et sécurisation des prisons



Sensibilisation des acteurs judiciaires sur des volets d'éthique et de célérité de traitement des dossiers judiciaires



Déconcentration des services de délivrance des duplicata de nationalité



Organisation des campagnes de sensibilisation des populations de la région des savanes sur la préservation de la paix et de la cohésion sociale



Renforcement des capacités des organisations de développement à la base

* : Hors sécurité et défense



Sécurité – Fiche projet

Objectifs

- Assurer la sécurité de la population dans la région
- Parvenir à une meilleure collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité aux fins de coproduction de la sécurité

Indicateurs


- 1500** Policiers recrutés
- 18** Nouveaux commissariats et postes de Police construits
- 10** Nouvelles brigades de gendarmerie construites
- 08** Préfectures (des savanes + Kéran) couvertes par les sensibilisations sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent

Activités principales

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025



Coûts, Mds de FCFA

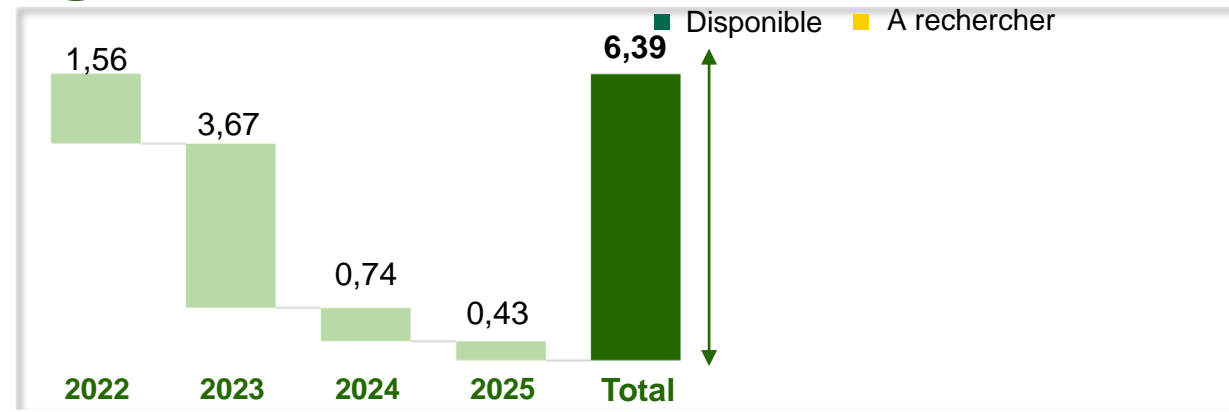

Cibles – Secteur Sécurité

- Phase d'urgence**
 - 10 immeubles non baillés réhabilités
- Court et moyen terme**
 - 38 véhicules légers acquis
 - 152 motos acquises
 - 19 sensibilisations organisées



Justice – Fiche projet



Objectifs

- Renforcer les capacités judiciaires dans la zone



Indicateurs

- 4 Nouvelles maisons de justice implantées et renforcées
- 4 Nouveaux locaux déconcentrés de délivrance des duplicata de nationalité togolaise installés
- 2 Etablissements pénitentiaires réhabilités et renforcés




Activités principales

Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- Etudes techniques et études d'impact environnemental et social
- Elaboration des dossiers d'appels d'offres pour le recrutement des prestataires
- Signature de contrat avec les prestataires
- Travaux de réalisation des infrastructures
- Appui à l'accès aux équipements informatiques, techniques et sensibilisations



Coûts, Mds de FCFA

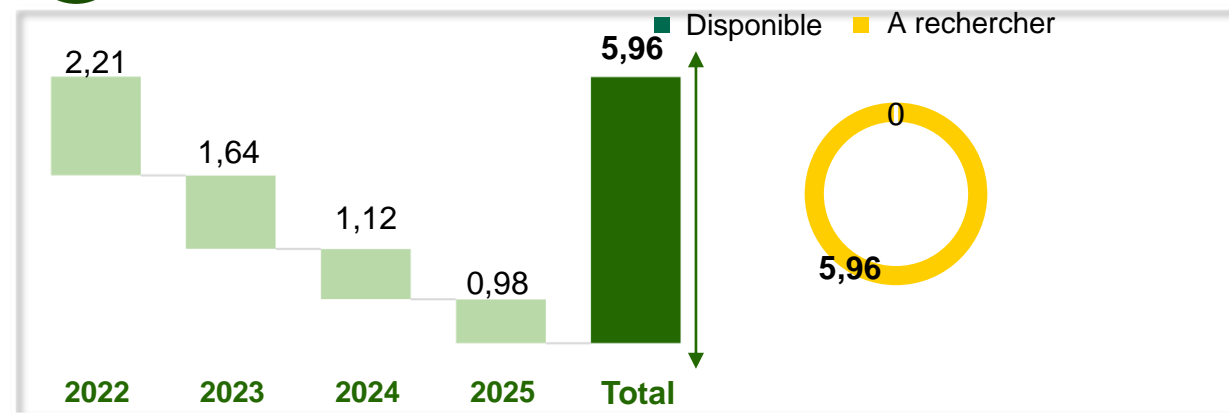

Cibles – Secteur Justice

- 250 sensibilisation des acteurs judiciaires tenus
- 8 émissions radiophoniques et télévisées réalisés



Administration territoriale – Fiche projet



Objectifs

- Renforcer les capacités des acteurs locaux



Indicateurs

Les collectivités locales de la région disposent des moyens humains et matériels adéquats pour le management local




Activités principales du projet d'urgence

Nov 2021 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 2023 2024 2025

- | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|----------|-----------|--|
| 1 | Désignation et la reconnaissance des chefs traditionnels | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |
| 2 | Renforcement de capacités des Acteurs locaux | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |
| 3 | Renforcement des capacités financière des collectivités territoriales (communes) de la région des savanes | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |
| 4 | Modernisation et sécurisation de l'état civil | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |
| 5 | Gestion des déchets dans la région des savanes | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |
| 6 | Construction et équipement des 6 mairies restantes | | | Nov 2021 | Sept 2022 | |
| 7 | Gouvernance et gestion du projet | Nov 2021 | Sept 2022 | | | |



Coûts, Mds de FCFA

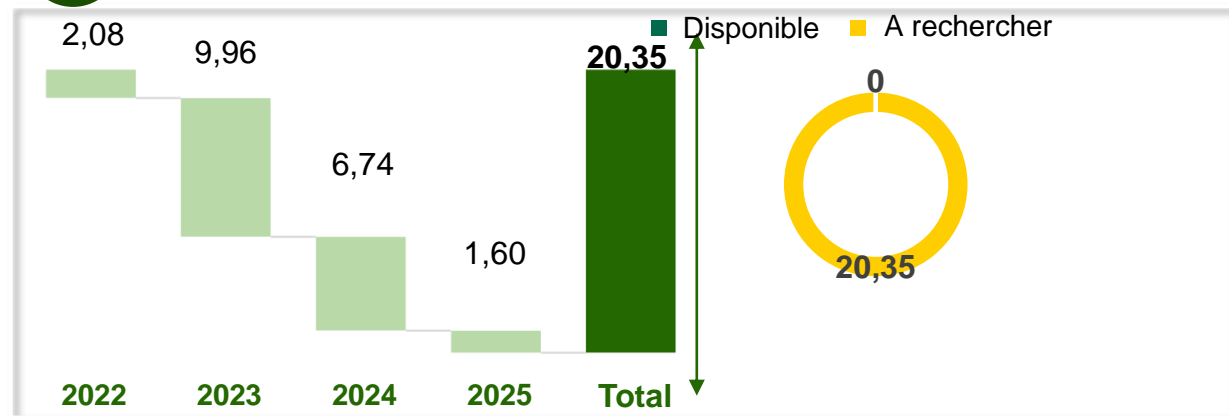

Cibles – Secteur de l'administration territoriale

- 69 Chefs de canton désignés et reconnus
- 3128 Acteurs locaux formés et sensibilisés
- 16 Centres d'état civil centraux construits et équipés
- 169 Centres d'état civil secondaires construits et équipés
- 169 Dépotoirs intermédiaires construits
- 16 Dépotoirs finaux construits
- 7 Centres de traitement des déchets construit et opérationnels
- 6 Mairies construites et équipées



Communication – Fiche projet

Objectifs



- Former les acteurs des radios installées dans la région des Savanes à l'appropriation du rôle social des médias et à l'acquisition d'aptitudes nécessaires à la préservation de la paix
- Doter les radios d'équipements légers (microphone, enregistreur)



Indicateurs

13

Radios de la région des Savanes sont équipées en enregistreurs et en microphones et leur personnel formé

1

Antenne régionale de la HAAC est installée et opérationnalisée dans la région des Savanes




Activités principales

Mars 2022 Déc 2022 2023 2024 2025 2026

- 1 Formation des reporters, animateurs d'émissions, directeurs et/ou propriétaires des treize (13) radios de la région des Savanes
- 2 Equipement des treize (13) radios de la région des Savanes en enregistreurs et en microphones
- 3 Installation et opérationnalisation de l'antenne régionale de la HAAC dans les Savanes notamment à Dapaong



Coûts, Mds de FCFA

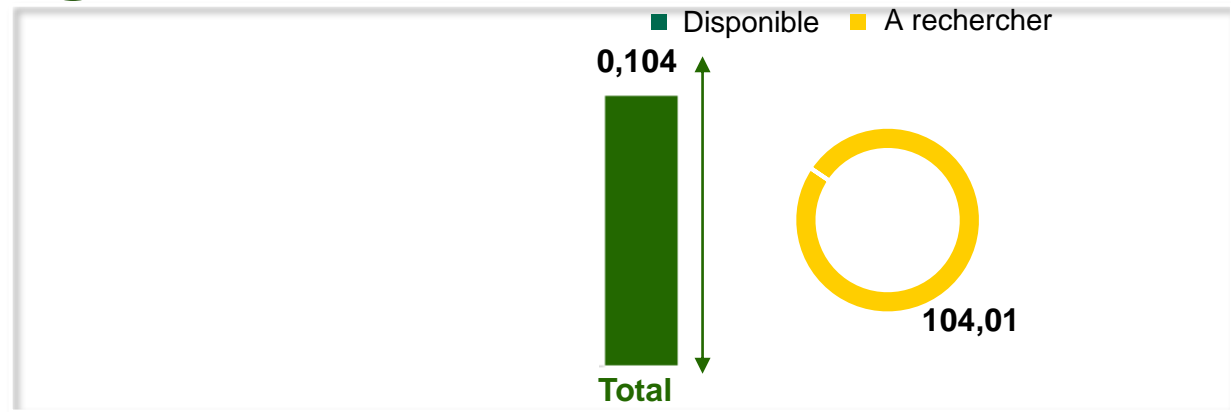



Présentation des stratégies de mobilisation des ressources, de mise en œuvre du programme et des facteurs de succès

Stratégies de mobilisation des ressources, de mise en œuvre et facteurs de succès

Stratégie de mobilisation des ressources

Stratégie de mobilisation des ressources

La réaffectation des ressources disponibles : il s'agira ici de **mobiliser** en priorité les ressources des activités des projets prévus pour se réaliser dans la région des savanes d'une part, et de **réorienter** les ressources de certaines activités pour la réalisation du programme d'urgence d'autre part.



La mobilisation des partenaires techniques et financiers : des activités de plaidoyers seront menées auprès des PTF pour mobiliser les financements complémentaires nécessaires pour la mise en œuvre du programme.

Secteurs ayant fait des réaffectations de ressources dans le cadre du « Savanes Yalim » :

	2022	2023-2025	2022-2025
Eau	1,84	18,94	20,78
Education	2,05	0,80	2,85
Agriculture	3,95	0	3,95
Energie	0,67	0	0,67
Santé	1,47	0	1,47
Développement à la base	0,34	0,08	0,42
Total	10,32	19,82	30,14

Montants en milliards FCFA



Mise en œuvre et suivi évaluation

Mécanisme de mise en œuvre*

- Les agences d'exécutions sectorielles ou transverses seront mobilisées par exemple :
 - AT2ER pour l'électrification
 - ANADEB pour les infrastructures de taille moyenne
 - UGP-PAPR pour le désenclavement et les pistes rurales
 - ANVT pour l'engagement volontaire
- Il pourrait être envisagé de s'appuyer sur des agences spécialisées du réseau des partenaires pour accélérer l'exécution.

Mécanisme de suivi évaluation


- Le suivi de la mise en œuvre du programme d'urgence sera effectué par le **ministère chargé de la planification en collaboration avec la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires**. Des tableaux de bord de l'avancement de la mise en œuvre du programme seront élaborés régulièrement et soumis à un **comité interministériel**.
- **Un comité de pilotage** présidé par le **Chef de l'Etat** pourra être mis en place pour faire la revue de l'avancement global du programme.

* : Une composante spécifique pourra être développée tout en évitant la lourdeur administrative dans l'exécution



Facteurs de succès

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE



Focalisation sur un ensemble d'actions avec un suivi rapproché et constant au niveau des ministères en charge jusqu'à leur aboutissement



Sensibilisation et mobilisation de la population ainsi que leur **adhésion** aux différentes activités



Suivi des projets aux niveaux de la Présidence de la République et de la Primature et transparence sur leur état d'avancement afin d'assurer une réalisation efficace et dans les meilleurs délais



Coordination et collaboration étroites entre les ministères afin de mettre en marche l'ensemble de la machine gouvernementale vers la mise en œuvre des projets



Maturation du design des projets et réalisation **d'études de faisabilité en amont** afin d'éviter des points de blocage pendant leur exécution



Implication et mobilisation des partenaires



Annexe – Etat d’avancement des projets sectoriels



Désenclavement et pistes rurales – Etat d’avancement

● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<p>1. Sélection des deux (2) cabinets :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande de Propositions (DP) élaborée, lancée, ouverte et évaluée ; - Rapport d’attribution achevé et transmis à la DNCMP pour ANO le 22 février 2022 ; <p>2. Sélection des entreprises :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossier d’Appel d’Offres International (DAOI) lancé, ouvert et évalué ; - Rapport d’attribution en cours d’achèvement.

Prochaines étapes	Dates
<p>1. Lancement études, contrôle et travaux phase 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attente ANO DNCMP sur le rapport final d’attribution des prestations à 2 cabinets - Finalisation de 2 contrats, signature et transmission à la DNCMP pour approbation du MEF ; - Démarrage des prestations d’études d’exécution y compris contrôle et surveillance des travaux , - Finalisation du rapport d’évaluation des offres des entreprises et transmission à DNCMP pour ANO ; - Finalisation de 6 marchés de travaux, signature et transmission à DNCMP pour approbation du MEF - Démarrage et exécution des études, travaux et contrôle puis surveillance des travaux en phase 1 <p>2. Démarrage études APS et APD des travaux phase 2</p> <p>3. Préparation des activités de la phase 2 du projet</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>



● En cours ● Retard ● Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<ul style="list-style-type: none"> • Phase 1 : <ul style="list-style-type: none"> - Appel d’offres (financement BIE) lancé, dépôt des offres le 8 février 2022; - 52 forages réalisés par la brigade mobile du MEHV; - Reliquat sur le PASCO2 confirmé • Phase 2 : <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de la liste des localités frontalières (PASSCO3) dont 351 (Savanes) et 300 (Kara) ; - Requête de financement signée par le MEF pour 6,6 Mds et transmise à l’AFD • Urbain: <ul style="list-style-type: none"> - Etudes détaillées et élaboration du DAO – en cours (PND eau) - Composante Extension: <ul style="list-style-type: none"> - Fournitures livrées à 75% et attribution des marchés en cours pour les travaux d’extension en milieu urbain - Etudes détaillées en cours pour confirmer le montant complémentaire

Prochaines étapes	Dates	
Attribution des marchés	15/03/2022	
• Elaboration et approbation des avenants aux marchés du PASCCO2	Fin mars 2022	●
• Elaboration du DAO PASSCO3	15/02/2022	●
• Finalisation des études détaillées du PND eau en milieu urbain	23/02/2022	●
• Finalisation de la livraison des fournitures et attribution des marchés en cours pour les travaux d’extension en milieu urbain	Fin mars 2022	●
• Poursuite des études détaillées pour confirmer le montant complémentaire avec la piste BEI envisagé avec l’AFD	23/02/2022	●



● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<ul style="list-style-type: none">• Sur le budget 2022 du ministère:<ul style="list-style-type: none">- 200 lampadaires solaires ont été déployés dans les localités de Sanloaga, Tabi, Gouloungoussi, Boadé, Nassiegou, Samnaba- Signature du contrat entre KYA Energy et l’AT2ER pour la livraison et l’installation des groupe électro solaires- Avis favorable de la DNCMP sur l’attribution des marchés aux entreprises pour l’électrification des localités de Gouloungoussi, Boade, Noaga, Samnaba, Nassiegou, Baoulé, Ponio, Timbou et Yemboate

Prochaines étapes	Dates
<ul style="list-style-type: none">• 6 postes militaires sur les 30 identifiés seront dotés de groupe électro solaires d’ici la fin du premier semestre 2022: il s’agit des sections Koundjoaré, Gouloungoussi, Bagre, Sanloaga, Bouldjouaré et Tchamonga• Démarrage des travaux d’électrification par extension de réseau dans les localités de Gouloungoussi, Boade, Noaga, Samnaba, Nassiegou, Baoulé. Les travaux seront livrés avant la fin du mois de Juillet	<p>Fin juillet 2022</p> <p>Fin juillet 2022</p>



● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<ul style="list-style-type: none"> • Détermination des gaps en équipements, en rapport avec les besoins et l’existant, aussi bien pour les ressources humaines que les équipements • Requête auprès de la CNGR et du MEF

Prochaines étapes	Dates	
• Visite de terrain par la DISEM	01/22	●
• Elaboration des DAO des constructions et des équipements des 07 centres par la DISEM	02/22	●
• Mobilisation des ressources	01/22	●
• Elaboration du manuel de procédures pour l’exploitation des CT : Plaidoyer / requête à l’OMS pour le recrutement d’un consultant	01/22	●



● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations

- Identification des besoins en éducation: 400 table bancs, 74 bâtiments scolaire au primaire, 08 bâtiments scolaires au secondaire, 01 bloc administratif, création de 02 collèges, création de 05 écoles primaires, réhabilitation de 14 bâtiments scolaires, transformation de CEG en Lycée à cycle complet, transformation d'établissement communautaire en Public
- Obtention de l'avis de non objection de la Banque mondiale (PAQEEB) pour la mission de confirmation des besoins et de collecte des données pour l'élaboration des études d'impact environnemental et social et élaboration des PGES
- Lancement de la mission de sélection environnementale et sociale pour la période du 28 février au 19 mars,

Prochaines étapes

Prochaines étapes	Dates	
• Elaboration des études d'impact environnemental et social et élaboration des Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)	28 février au 25 mars	●
• Formation des communautés sur l'Organisation de la Dynamique Communautaire et sur la passation des marchés communautaires et transparence	1 ^{er} mars-30 avril	●
• Lancement et exécution des travaux de construction et équipement de salles de classe primaire (PAQEEB), secondaire 1 (PAREC2, PAQEEB)	06 mai -10 sept.	●
• Formation des communautés sur le l'Entretien et la Maintenance des Ouvrages (EMO)	18-30 juillet	●



Télécommunication – Etat d’avancement

● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<ul style="list-style-type: none">• Desserte et Renforcement de la couverture en services de Télécommunications dans 9 sites de présence des FAT et des environs : Niokprouma, Nassiégou, Gouloungoussi, Sanloaga, Pekakandi, Tchamonga, Nadoba, Mogou et Gando• Identification d’une stratégie de couverture 9 localités blanches: Bounfiag, Gbenyeri, Gnienpole, Koumbianbagou, Nadandjoaga, Nagbangou, Palambogou, Wantambogou et Yeringue.

Prochaines étapes	Dates	
• Démarrage de la campagne de contrôle de la qualité des services de télécommunications	Fin mars 2022	●
• Renforcement de la qualité de service dans 17 localités dont tous les chefs-lieux de préfecture	Fin Juillet 2022	● ●



● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations
<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation en cours de 8 ZAAP d’urgence sur la bande frontalière avec le Burkina-Faso et le Bénin • Recrutement des entreprises pour la réalisation de 39 ZAAP • Consolidation des bas-fonds à aménager • Réalisation en cours de 24 forages sur les ZAAP de première vague 2021 pour l’installation des systèmes d’irrigation • Installation en cours de 46 kits d’irrigation à base de pompage solaire • Construction en cours d’une aire d’abattage de bétail à Dapaong

Prochaines étapes	Dates
<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement de 5 000 ha pour les ZAAP • Aménagement de 1 000 ha de bas-fonds • Acquisition et plantation de 6 000 arbres à usage multiple (anacardiens, karité, manguiers, agrume etc.) autour des ZAAP • Acquisition et installation de 1 200 kits d’irrigation et réalisation de 50 forages sur les ZAAP 2ème vague 2022 • Acquisition et mise à disposition des intrants agricoles (semences, fertilisants, biopesticides) • Appui aux producteurs pour l’acquisition de tracteurs (subvention à 50%) • Construction de 10 magasins de stockage des produits agricoles • Financer 40 projets portés par des jeunes entrepreneurs agricoles • Appuyer les producteurs en équipements de transformation agricole (15 égreneuses de maïs, 50 décortiqueuses, 20 batteuses-vanneuses de riz, 15 décortiqueuses-vanneuses de soja) • Mise en place d’un centre régional provisoire de mécanisation agricole à partir des matériels disponibles dans les magasins régionaux et regroupés au niveau de Tchitchao 	<p>Mars à décembre 2022</p>





Administration territoriale – Etat d'avancement

● En cours ● Retard ● ! Retard prononcé ● A venir

Principales réalisations

- Construction et équipement des 6 mairies restantes
 - . Etudes architecturales disponibles

Prochaines étapes

Dates

- | | | |
|--|-------|---|
| • Identification des sites par le maire | 03/22 | ● |
| • Visite de terrain par une équipe du MATDDT | 03/22 | ● |
| • Etudes géotechnique et levées topographiques de chacun des 6 sites | 04/22 | ● |
| • Etudes techniques de chacun des 6 sites | 05/22 | ● |
| • Elaboration des DAO des constructions et des équipements | 06/22 | ● |
| • Mobilisation des ressources | 07/22 | |
